




旧工場棟 空調機械室

①石綿除去前の隔離養生確認検査状況



旧工場棟 破碎機室

②石綿除去完了後の確認検査状況

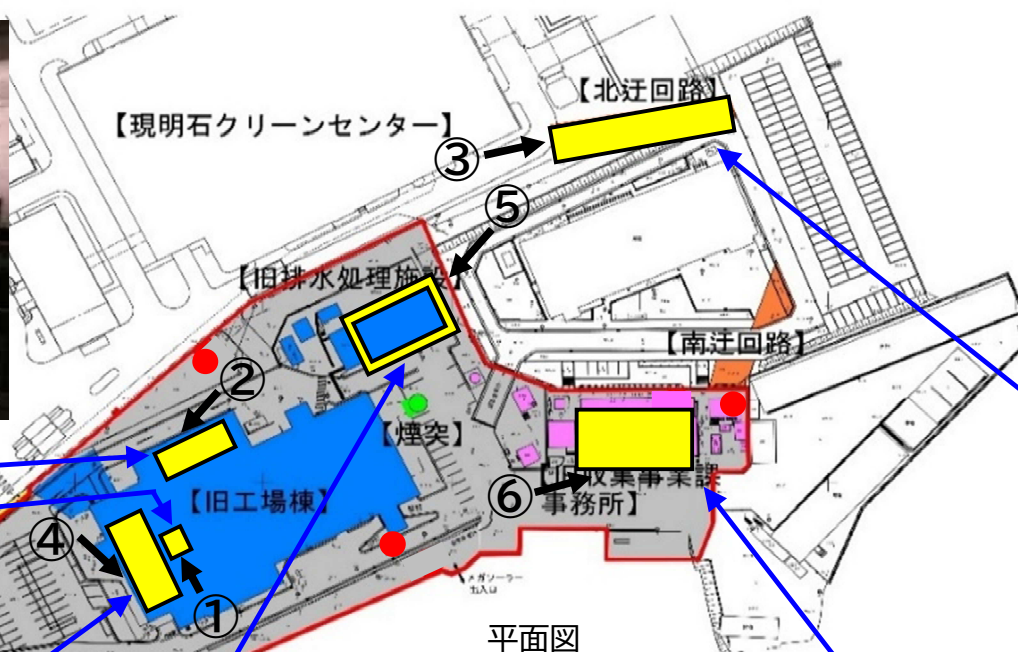

平面図



旧工場棟 4階

④旧工場棟 内装解体状況



旧排水処理施設

⑤旧排水処理施設 外部養生足場組立状況



北迂回路（構内道路）

③北迂回路工事状況



旧収集事業課事務所

⑥旧収集事業課事務所 杭抜き状況

【環境調査結果状況】

令和7年11月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

項目	環境調査結果
ダイオキシン類（大気） （基準値：0.6pg-TEQ/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口 「対象の作業がないため、測定なし」
ダイオキシン類（土壌） （基準値：1000pg-TEQ/g）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 「対象の作業がないため、測定なし」
粉じん（大気） （基準値：1.5mg/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
石綿（大気） （基準値：10本/L）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口、前室出入口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
騒音 （基準値：85dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。
振動 （基準値：75dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。



旧収集事業課事務所
基礎解体、杭抜き工事完了

空撮写真（2025年11月26日）

令和7年11月は、旧収集事業課事務所では基礎解体および杭抜き工事が完了し、整地をしています。旧工場棟では内装解体工事および石綿除去工事は引き続き進めていきます。旧排水処理施設では外部養生足場組立工事を行っています。

【今月の予定】

- ・旧収集事業課事務所 整地
- ・旧工場棟 内装解体工事
石綿除去工事
- ・旧排水処理施設 外部養生足場組立工事
- ・北迂回路、南迂回路 構内道路工事



工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくは
こちらから
