



旧工場棟 空調機械室

①石綿除去完了後の確認検査状況



旧工場棟 ボイラー室

②石綿除去完了後の確認検査状況



旧工場棟 屋上

④嵩上げコンクリート撤去状況




旧工場棟 ごみピット上部

⑤旧工場棟 密閉養生状況



旧工場棟

⑥旧工場棟 外部養生足場組立状況

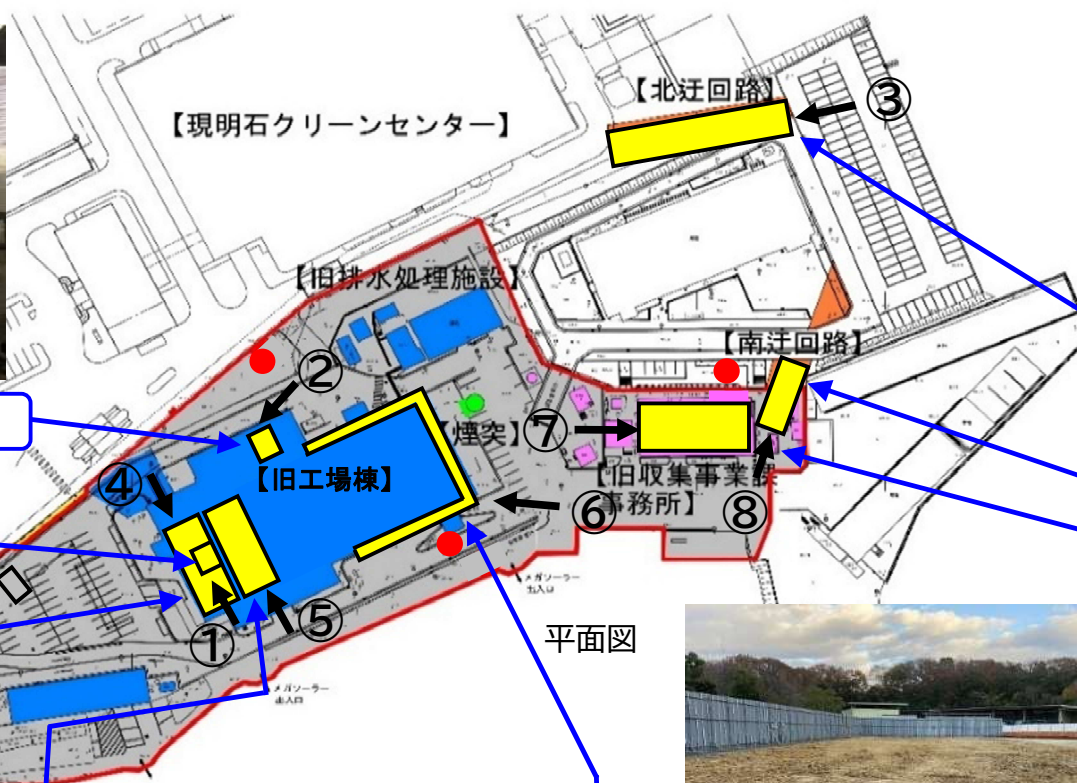

平面図




北迂回路（構内道路）

③北迂回路工事完了



南迂回路（構内道路）

⑧南迂回路工事状況

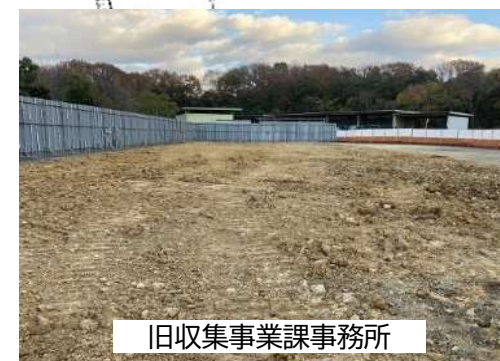

旧収集事業課事務所

⑦旧収集事業課事務所 解体工事完了

【環境調査結果状況】

令和7年12月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

| 項目 | 環境調査結果 |
|--|---|
| ダイオキシン類（大気） （基準値：0.6pg-TEQ/m ³ ） | 測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口 「対象の作業がないため、測定なし」 |
| ダイオキシン類（土壌） （基準値：1000pg-TEQ/g） | 測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 「対象の作業がないため、測定なし」 |
| 粉じん（大気） （基準値：1.5mg/m ³ ） | 測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。 |
| 石綿（大気） （基準値：10本/L） | 測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口、前室出入口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。 |
| 騒音 （基準値：85dB） | 測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。 |
| 振動 （基準値：75dB） | 測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。 |



北迂回路工事完了

旧収集事業課事務所
解体工事完了

空撮写真（2025年12月23日）

令和7年12月は、旧収集事業課事務所は解体工事が完了しました。旧工場棟では内装解体工事、石綿除去工事、外部養生足場組立工事、ダイオキシン類除染に伴う密閉養生を引き続き進めています。構内道路工事では北迂回路工事が完了し、南迂回路工事を行っています。

【今月の予定】

・旧工場棟

内装解体工事
石綿除去工事
外部養生足場組立工事
ダイオキシン類除染工事
構内道路工事

・南迂回路

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくは
こちらから
