


①仮囲い設置状況

②重機出入口設置先行解体状況

③アスファルト防水撤去状況

④外部養生足場設置状況

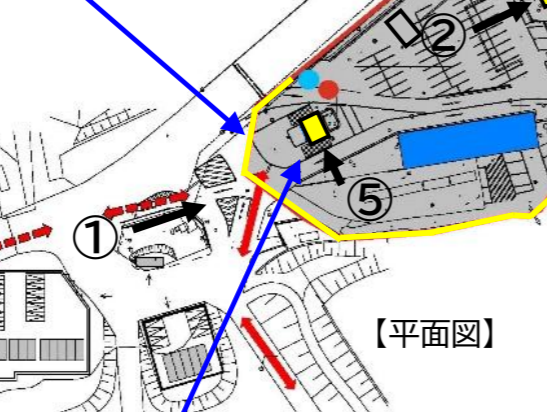

⑤内装解体状況

⑦出入口エアシャワー設置状況

⑥アスファルト防水撤去状況

【環境調査結果状況】

令和8年2月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

項目	環境調査結果
ダイオキシン類 (大気) (基準値: 0.6pg-TEQ/m ³)	測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●)、集じん機排気口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
ダイオキシン類 (土壌) (基準値: 1000pg-TEQ/g)	測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●) 工事前の状況確認のため基準値以下の土壌を設置しました。現在経過観察中です。
粉じん (大気) (基準値: 1.5mg/m ³)	測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●) 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
石綿 (大気) (基準値: 10本/L)	測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●)、集じん機排気口、前室出入口 「対象の作業がないため、測定なし」
騒音 (基準値: 85dB)	測定地点: 工事範囲境界1地点 (図中●) 工事中において、基準値を下回っていました。
振動 (基準値: 75dB)	測定地点: 工事範囲境界1地点 (図中●) 工事中において、基準値を下回っていました。



令和8年2月は、収集事業課への通行ルートを変更し、工事範囲の拡大に伴い仮囲いの設置位置も変更しました。旧工場棟では、重機等の出入口 (前室) 設置工事や外部養生足場設置工事、ダイオキシン類が拡散しないよう、専門的な方法で除去する除染工事などを引き続き進めていきます。

【今月の予定】

- 旧工場棟
 - 重機等搬入に伴う前室設置工事
 - 外部養生足場設置工事
 - ダイオキシン類除染工事
- 旧排水処理施設
 - 外部養生足場設置工事
 - ダイオキシン類除染工事

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくは
こちらから
