





計量棟 南

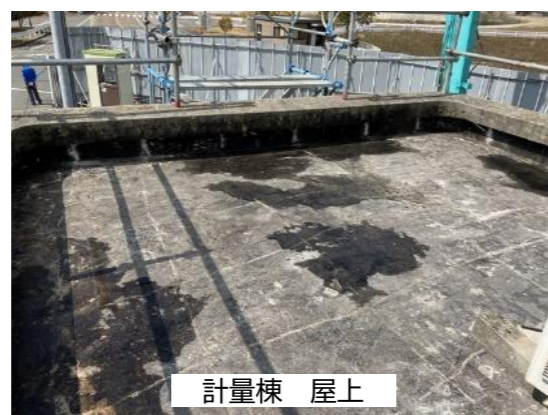

計量棟 屋上

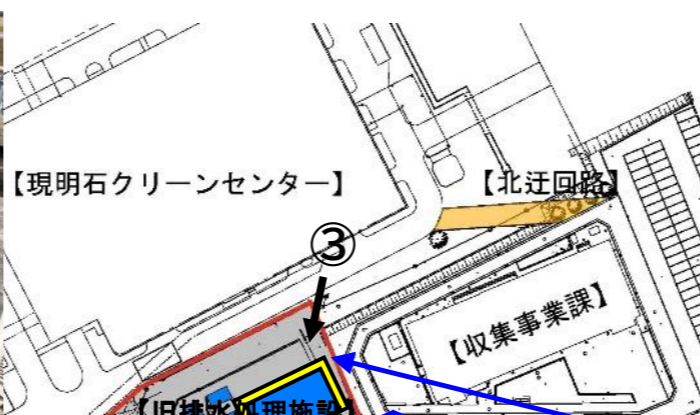

【現明石クリーンセンター】

【北迂回路】

【収集事業課】

【旧排水処理施設】

【旧工場棟】

【事務所】



旧排水処理施設



旧工場棟 ボイラー室煙突

①トラックスケール 撤去状況


②アスファルト防水 撤去状況

③外部養生足場 設置状況

④隔離養生 設置状況



旧工場棟 西側

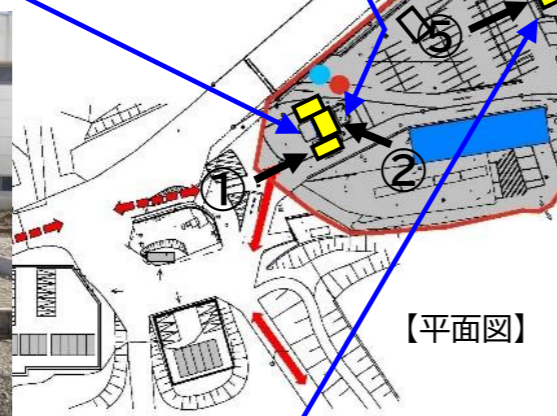

【平面図】



旧工場棟

⑥誘引送風機3号機煙道 洗浄状況



旧工場棟 (東)

⑦既存スロープ 撤去完了

⑤重機等搬入に伴う前室 土間工事状況

【環境調査結果状況】

令和8年3月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

| 項目   | 環境調査結果  |
|--|---|
| ダイオキシン類 (大気)<br>(基準値: 0.6pg-TEQ/m <sup>3</sup> ) | 測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●)、集じん機排気口<br>工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。       |
| ダイオキシン類 (土壌)<br>(基準値: 1000pg-TEQ/g)              | 測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●)<br>工事前の状況確認のため基準値以下の土壌を設置しました。現在経過観察中です。      |
| 粉じん (大気)<br>(基準値: 1.5mg/m <sup>3</sup> )         | 測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●)<br>工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。               |
| 石綿 (大気)<br>(基準値: 10本/L)                          | 測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●)、集じん機排気口、前室出入口<br>工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。 |
| 騒音<br>(基準値: 85dB)                                | 測定地点: 工事範囲境界1地点 (図中●)<br>工事中において、基準値を下回っていました。                      |
| 振動<br>(基準値: 75dB)                                | 測定地点: 工事範囲境界1地点 (図中●)<br>工事中において、基準値を下回っていました。                      |



トラックスケール撤去

既存スロープ撤去

空撮写真 (2026年3月27日)

令和8年3月は、旧排水処理施設の外部養生足場設置工事が完了しました。旧工場棟では重機等の出入口(前室)設置工事やダイオキシン類が拡散しないよう、専門的な方法で除去する除染工事などを引き続き進めていきます。

- 【今月の予定】
- 旧工場棟 重機等搬入に伴う前室設置工事  
ダイオキシン類除染工事
  - 旧排水処理施設 ダイオキシン類除染工事
  - 煙突 外部養生足場設置工事



工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、  
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくはこちらから
