




① 洗浄水浸透防止対策



② 外部養生足場 密閉養生状況



④ 重機等搬入前室 養生足場組立状況

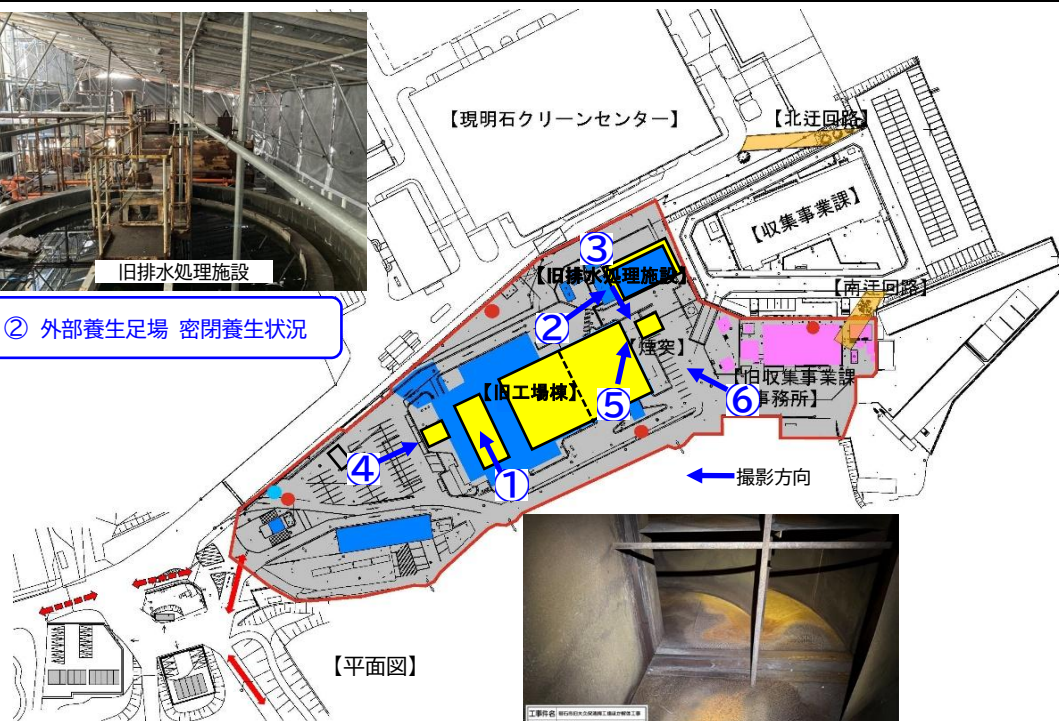

⑤ 誘引送風路 (煙道) 洗浄完了状況



③ 煙道部分撤去 前室土間工事状況



⑥ 外部養生足場 設置状況

### 【環境調査結果状況】

令和8年4月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

項目	環境調査結果
ダイオキシン類 (大気) (基準値: 0.6pg-TEQ/m <sup>3</sup> )	測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●)、集じん機排気口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
ダイオキシン類 (土壌) (基準値: 1000pg-TEQ/g)	測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●) 工事前後の状況確認のため基準値以下の土壌を設置し、現在経過観察中です。
粉じん (大気) (基準値: 1.5mg/m <sup>3</sup> )	測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●) 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
石綿 (大気) (基準値: 10本/L)	測定地点: 工事範囲境界4地点 (図中●)、集じん機排気口、前室出入口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
騒音 (基準値: 85dB)	測定地点: 工事範囲境界1地点 (図中●) 工事中において、基準値を下回っていました。
振動 (基準値: 75dB)	測定地点: 工事範囲境界1地点 (図中●) 工事中において、基準値を下回っていました。



令和8年4月は、煙突において前室土間工事が完了しました。旧工場棟、旧排水処理施設及び煙突では重機等の出入口 (前室) 設置工事やダイオキシン類が拡散しないよう、専門的な方法で除去する除染工事などを引き続き進めていきます。

#### 【今月の予定】

- ・旧工場棟  
ダイオキシン類除染工事  
重機等搬入に伴う前室設置工事
  - ・旧排水処理施設  
ダイオキシン類除染工事
  - ・煙突  
ゴンドラ設置  
外部養生足場・前室設置工事  
ダイオキシン類除染に伴う密閉養生
- ※ GW休業期間 2026年5月1日 (金) ~5月6日 (水)  
(期間中の安全対策は継続します)

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。  
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、  
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくは  
こちらから
