





旧工場棟 西側

① 重機等搬入前室 養生足場組立状況

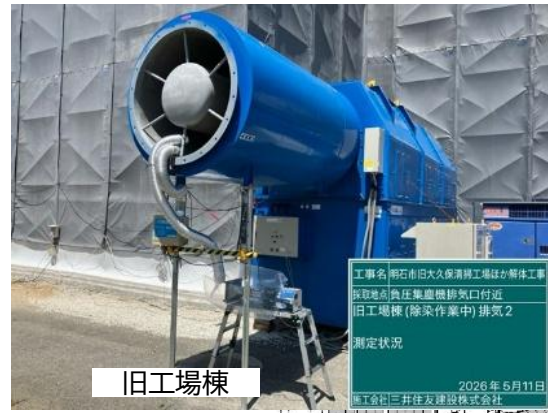

旧工場棟

④ ダイオキシン類除染工事作業中
負圧集塵機排気口付近 環境調査状況

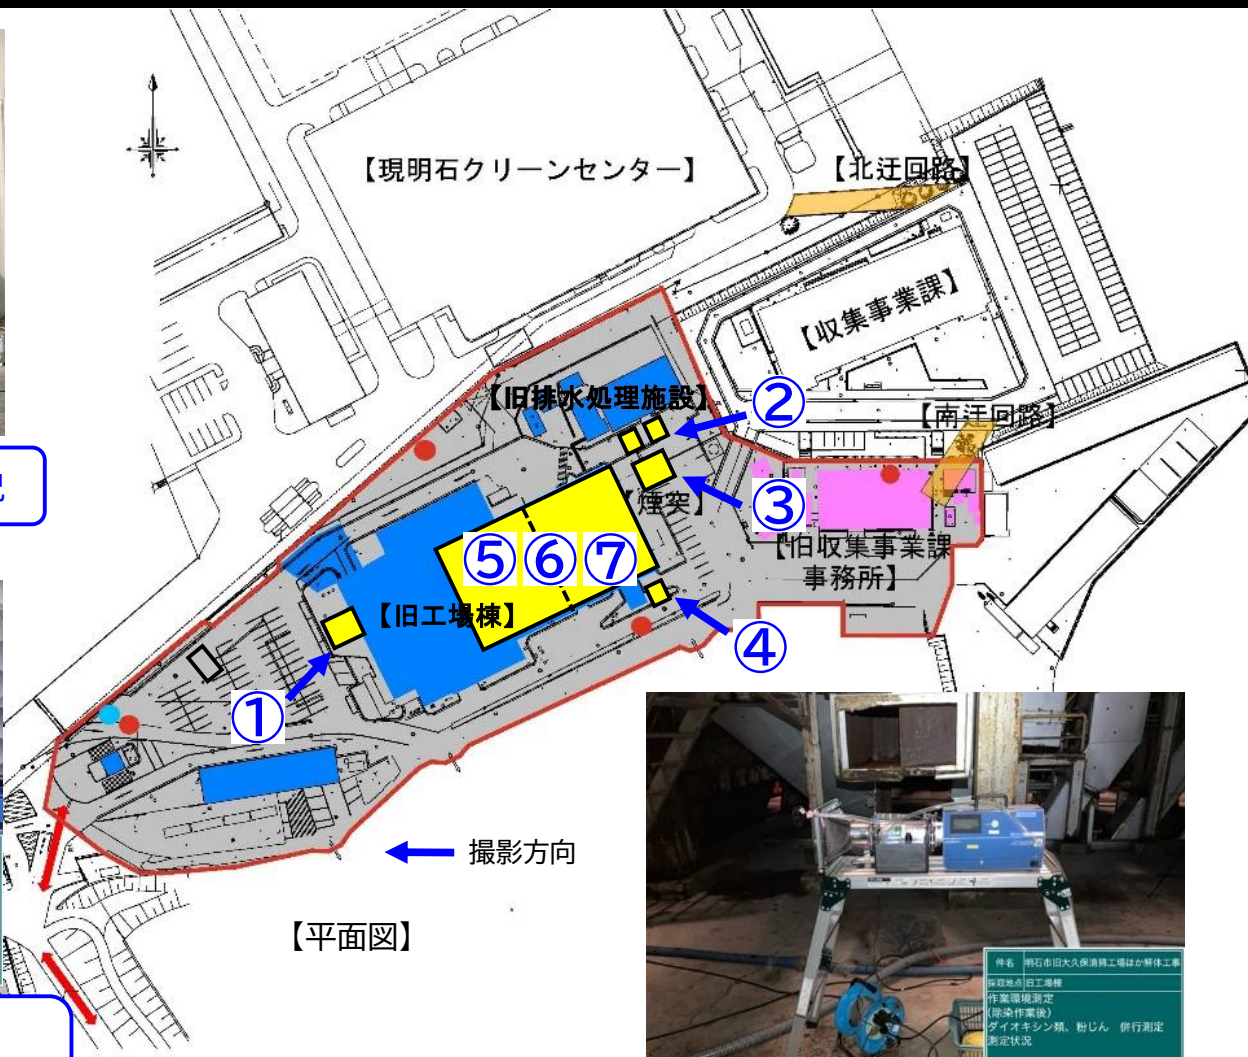

【平面図】

撮影方向



旧工場棟

⑤ ダイオキシン類除染工事完了後
管理区域内 作業環境測定状況




旧排水処理施設

② 負圧集塵機 設置状況



煙突

③ 外部養生足場 設置完了状況

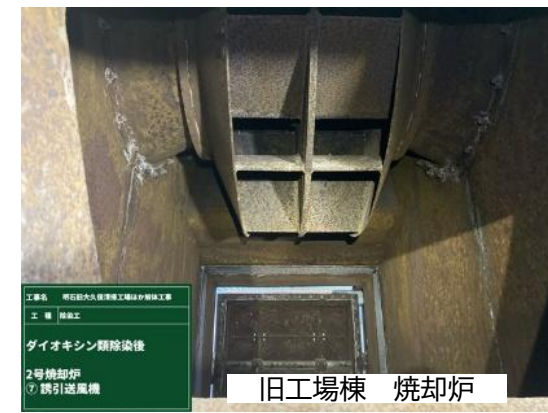

旧工場棟 焼却炉

⑥ 誘引送風機 洗浄完了状況



旧工場棟 焼却炉

⑦ ガス冷却室 洗浄完了状況

【環境調査結果状況】

令和8年5月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

項目	環境調査結果
ダイオキシン類（大気） （基準値：0.6pg-TEQ/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
ダイオキシン類（土壌） （基準値：1000pg-TEQ/g）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事前後の状況確認のため基準値以下の土壌を設置し、現在経過観察中です。
粉じん（大気） （基準値：1.5mg/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
石綿（大気） （基準値：10本/L）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口、前室出入口 「対象の作業がないため、測定なし」
騒音 （基準値：85dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。
振動 （基準値：75dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。



ダイオキシン類除染工事完了

空撮写真（2026年5月25日）

令和8年5月は、旧工場棟のダイオキシン類除染工事および煙突の外部養生足場組立工事が完了しました。
今月からは、旧工場棟のプラント機器解体工事と旧排水処理施設および煙突におけるダイオキシン類が拡散しないよう専門的な方法での除染工事を進めてまいります。

【今月の予定】

- 旧工場棟 プラント機器解体工事
- 旧排水処理施設 ダイオキシン類除染工事
上屋解体工事
- 煙突 ダイオキシン類除染工事
内筒耐火材撤去工事

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくは
こちらから

