





旧排水処理施設

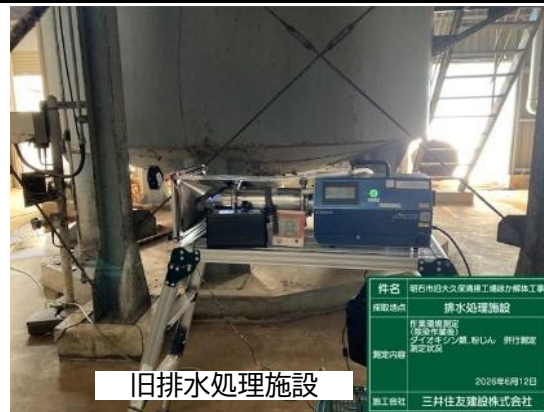

旧排水処理施設

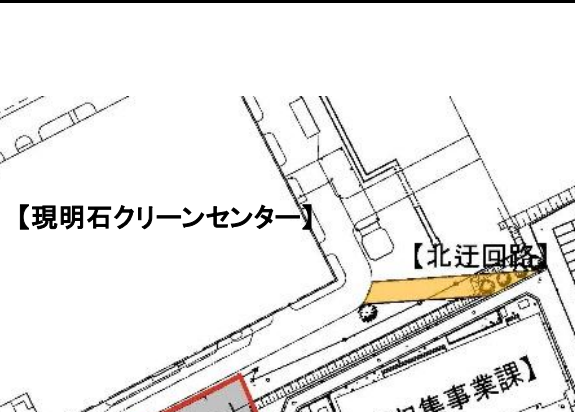

【現明石クリーンセンター】



煙突



煙突

① ダイオキシン類除染工事完了後
管理区域内 作業環境測定状況


② ダイオキシン類除染完了後
の確認検査状況

③ クリーンルーム
負圧集塵機 設置状況

④ ダイオキシン類除染工事作業中
負圧集塵機排気口付近 環境調査状況



旧工場棟 西側

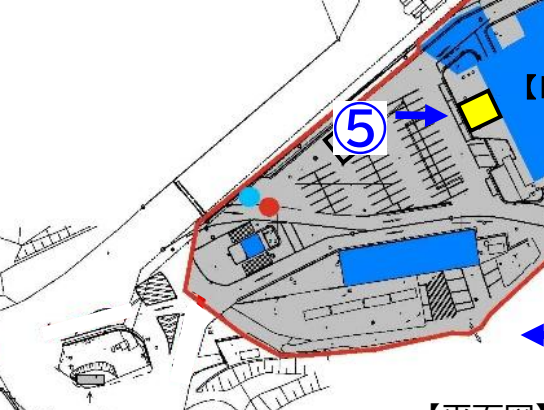

【平面図】

⑤ 重機等搬入前室、クリーンルーム 設置状況



旧工場棟 焼却炉



旧工場棟 焼却炉

⑦ プラント機器 解体状況

⑥ ダイオキシン類除染完了後の確認検査状況

【環境調査結果状況】

令和8年6月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

項目	環境調査結果
ダイオキシン類（大気） （基準値：0.6pg-TEQ/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
ダイオキシン類（土壌） （基準値：1000pg-TEQ/g）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事前後の状況確認のため基準値以下の土壌を設置し、現在経過観察中です。
粉じん（大気） （基準値：1.5mg/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
石綿（大気） （基準値：10本/L）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口、前室出入口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
騒音 （基準値：85dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。
振動 （基準値：75dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。



ダイオキシン類除染工事完了

ダイオキシン類除染工事完了

空撮写真（2026年6月24日）

令和8年6月は、旧排水処理施設および煙突のダイオキシン類除染工事が完了しました。また、旧工場棟のプラント機器解体工事をすすめています。

今月から旧排水処理施設の上屋解体工事、煙突の内筒の耐火材撤去工事を進めてまいります。

【今月の予定】

- 旧工場棟 プラント機器解体工事
- 旧排水処理施設 上屋解体工事
- 煙突 内筒耐火材撤去工事

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくは
こちらから
