




旧工場棟 焼却炉

① プラント機器解体作業中 作業環境調査状況



旧工場棟 焼却炉

② プラント機器 解体状況

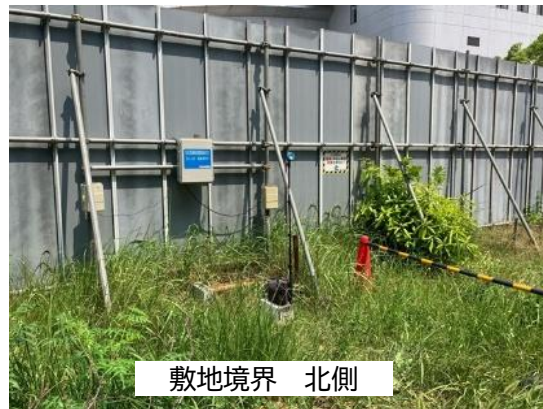

敷地境界 北側

④ 煙突耐火材撤去に伴う 環境調査状況



【平面図】



煙突

⑤ 内筒耐火材 撤去状況



旧排水処理施設

③ 上屋 解体状況



旧排水処理施設

⑥ 上屋 解体完了状況

【環境調査結果状況】

令和8年7月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

項目	環境調査結果
ダイオキシン類（大気） （基準値：0.6pg-TEQ/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
ダイオキシン類（土壌） （基準値：1000pg-TEQ/g）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事前後の状況確認のため基準値以下の土壌を設置し、現在経過観察中です。
粉じん（大気） （基準値：1.5mg/m ³ ）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
石綿（大気） （基準値：10本/L）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口、前室出入口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
騒音 （基準値：85dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。
振動 （基準値：75dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。



上屋解体工事完了

空撮写真（2026年7月27日）

令和8年7月は、旧排水処理施設の上屋解体が完了しました。旧工場棟ではプラント機器解体工事、煙突では内筒耐火材撤去工事をすすめています。

今月は、旧工場棟のプラント機器解体工事完了後に管理区域内の作業環境調査を行います。

【今月の予定】

- 旧工場棟 プラント機器解体工事
作業環境測定
- 旧排水処理施設 周辺機器解体工事
- 煙突 内筒耐火材撤去工事
内筒撤去準備工事

※ 夏季休業期間 2026年8月12日（水）～8月16日（日）
（期間中の安全対策は継続します）

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくは
こちらから
