





①環境調査測定用の騒音計・振動計・デジタル粉じん計を設置しました



②内装解体が完了しました

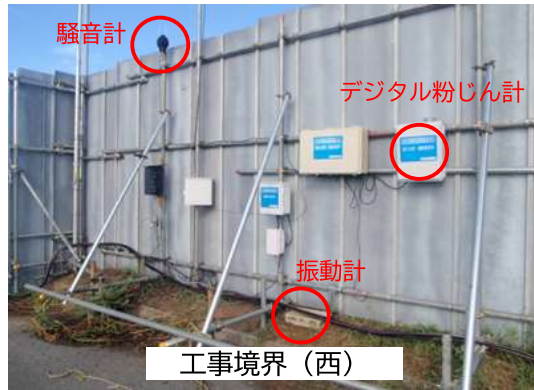

④内装解体を進めています

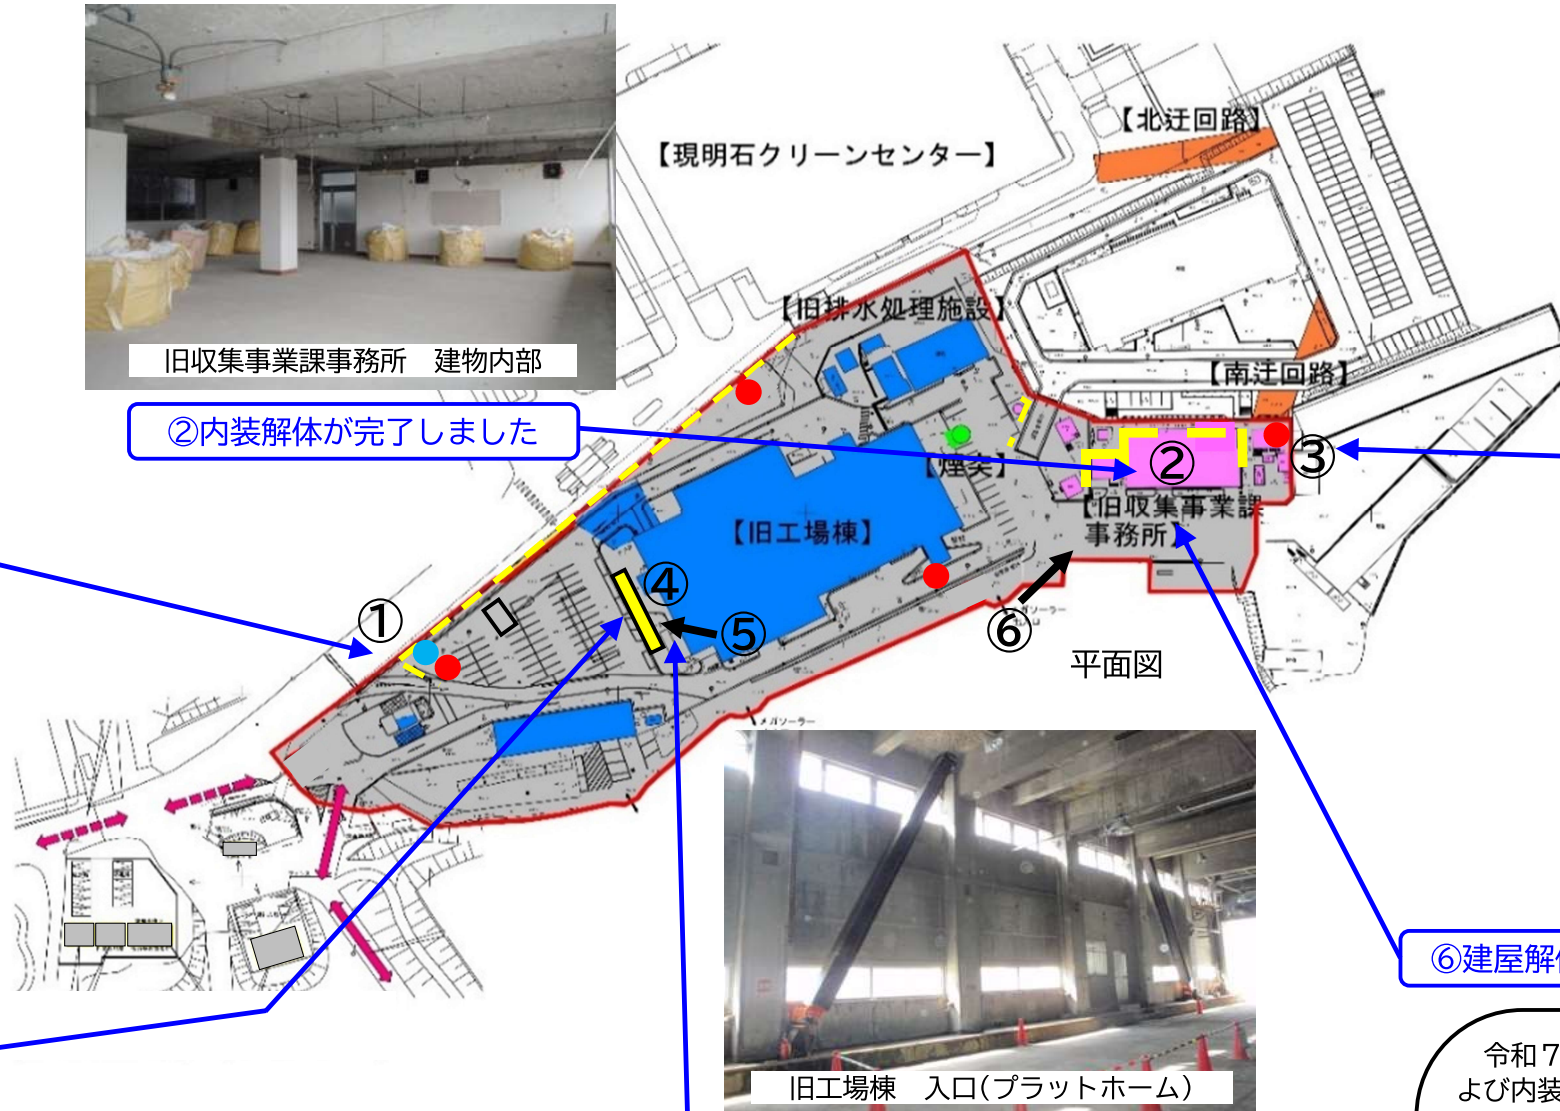

⑤建物内作業を円滑にするために、壁に開口部を設ける準備として、柱や梁を筋交いで補強する工事を行いました



③石綿除去工事時に必要となる隔離養生および前室を設置しました



⑥建屋解体に向けて、仮囲い・養生足場を設置しました

## 【環境調査結果状況】

令和7年9月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

| 項目                                             | 環境調査結果                                                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ダイオキシン類（大気）<br>（基準値：0.6pg-TEQ/m <sup>3</sup> ） | 測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口<br>「対象の作業がないため、測定なし」                      |
| ダイオキシン類（土壌）<br>（基準値：1000pg-TEQ/g）              | 測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）<br>「対象の作業がないため、測定なし」                              |
| 粉じん（大気）<br>（基準値：1.5mg/m <sup>3</sup> ）         | 測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）<br>「対象の作業がないため、測定なし」                              |
| 石綿（大気）<br>（基準値：10本/L）                          | 測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口、前室出入口<br>工事前、工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。 |
| 騒音<br>（基準値：85dB）                               | 測定地点：工事範囲境界1地点（図中●）<br>「対象の作業がないため、測定なし」                              |
| 振動<br>（基準値：75dB）                               | 測定地点：工事範囲境界1地点（図中●）<br>「対象の作業がないため、測定なし」                              |



令和7年9月に、旧収集事業課事務所において石綿除去工事および内装解体工事を実施し、無事に完了しました。今月から建物の解体工事を始めるため、騒音計・振動計・デジタル粉じん計を設置し、環境に配慮した作業を行います。旧工場棟では建物内部の工事を引き続き進めていきます。

### 【今月の予定】

- ・旧収集事業課事務所 建屋解体工事
- ・旧工場棟 内装解体工事  
ごみピット清掃・埋戻し  
石綿除去工事  
構内道路工事
- ・北迂回路

※埋戻し等の工事で使用する土は、重金属等有害物質を含まない土を搬入します。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、  
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくは  
こちらから
