

①	諸室名の変更・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1
②	1 階フリースペースの柱にギャラリー棚設置・・・・・・・・	P 2
③	1 階保育ルーム（一時預かり）からみんなのリビングに変更・・・・・・・・	P 3
④	2 階吹き抜けカウンターの落下防止対策・・・・・・・・	P 4
⑤	4 階屋上広場日除け設置・・・・・・・・	P 5
⑥	屋外広場植栽帯擁壁にロゴマークサイン設置・・・・・・・・	P 6

① 諸室の名称変更

階数	原諸室名	変更後諸室名
1	フリースペース	icottoひろば(中)
	屋外広場	icottoひろば(外)
	地域活動スペース	地域共生スペース
	保育ルーム	みんなのリビング
	多目的コーナー	icottoらぼ
2	会議室①～③	市民活動室①～③
	多目的室④	アクティブブース
3	図書コーナー	図書フロア
4	多目的ホール	icottoホール
	屋上広場	icottoテラス

※3階図書フロア内の「おはなしの部屋」は取りやめとする。



「別紙3-2変更内容（家具図）」A413家具プロット図(2)・A424家具詳細図(11) 参照

② 1階icottoひろば(中) の柱にギャラリー棚設置

■柱1面に棚3ヶ所×4面設置

製品名：APS-16 (ROYAL)

- ・高さ2400mm
- ・展示棚はピッチ25mmごとに高さ調節可能 (メラミン化粧板)
- ・棚荷重ブラケット2本当たり23kg程度
- ・照明なし

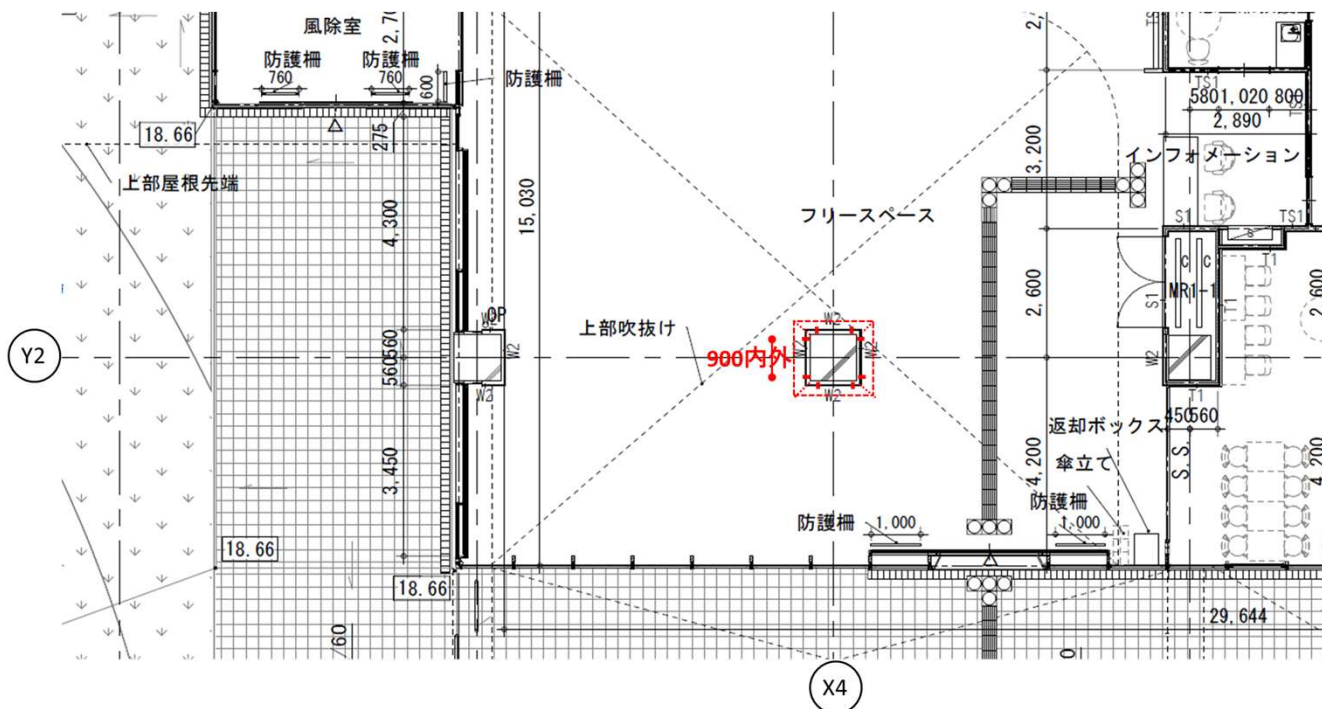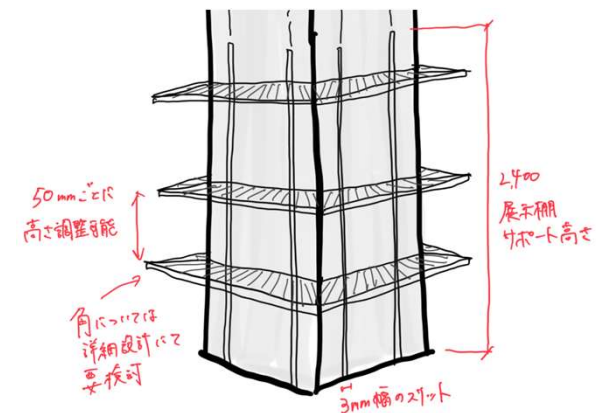





※上記品番は、参考選択例です。

(引用元 ROYAL HP)

③ 1階保育ルーム（一時預かり）からみんなのリビングに変更

- ・ガラスパーテーション取止め
- ・ミニキッチン(調乳用) L1200取止め
- ・天井カセット型室内機（1方向）2台取止め
- ・全熱交換機（天井カセット）3台→2台に変更
- ・手洗い設置（手洗い+子ども手洗い）

掃き出し窓に変更3連引戸の場合（現状AW02, AW03）

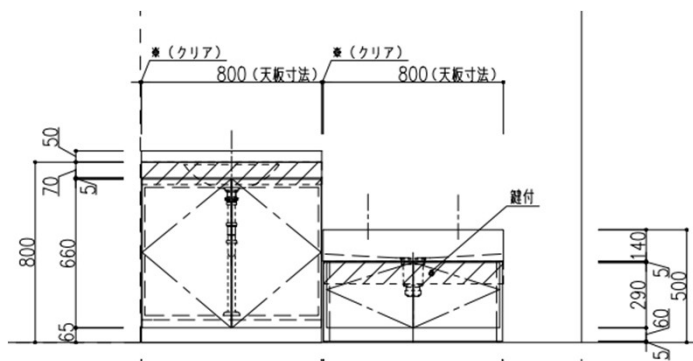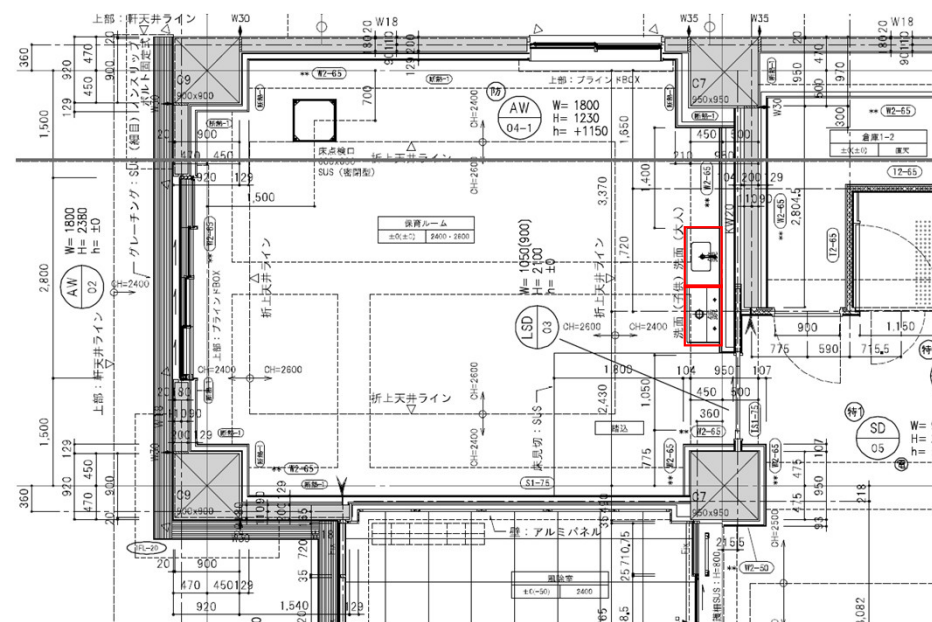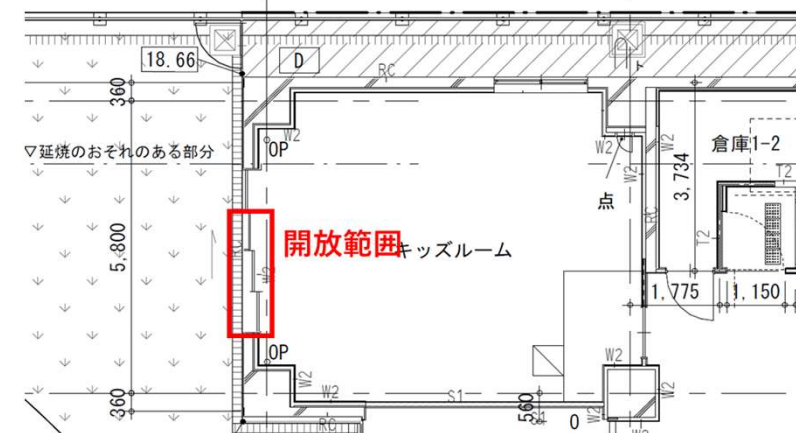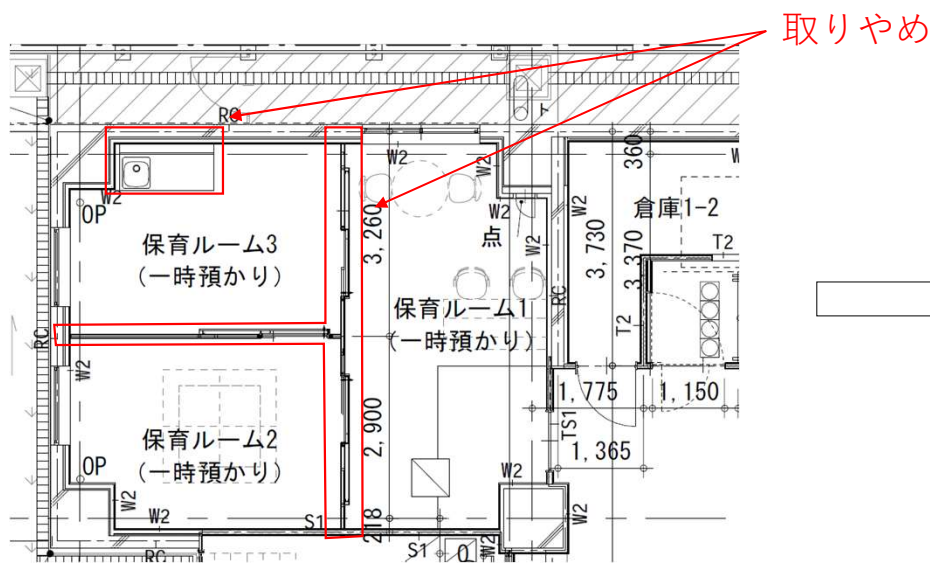


仕様：オリジナル洗面カウンター	
天板	D=450 人工大理石 t=10 色：ホワイト単色
ボウル	人工大理石 KMB4AGW-3 (アイカ)
排水キャップ	HMB3015 金属製メッキ仕上げ (アイカ)
排水金具	HMB3005 (アイカ)
排水トラップ	HMB3003 ストラップ (アイカ)
キャビネット	低圧メラミン(ホワイト)
扉	メラミン扉 色：未定
台輪	メラミン貼り 色：扉同色

仕様：アイカ キッズ洗面	
ワークトップ	ボウル一体型人工大理石 コリアン
キャビネット (形状・色)	メラミンキャビネット 色：未定


④ 2階吹き抜けカウンターの落下防止対策

■腰壁＋カウンター上部足掛かりからH1,100の高さのガラス手摺

- ・設計時のカウンター以外の手摺取止め
- ・スタンド照明追加
- ・ガラス手摺追加
- ・腰壁ボード等追加


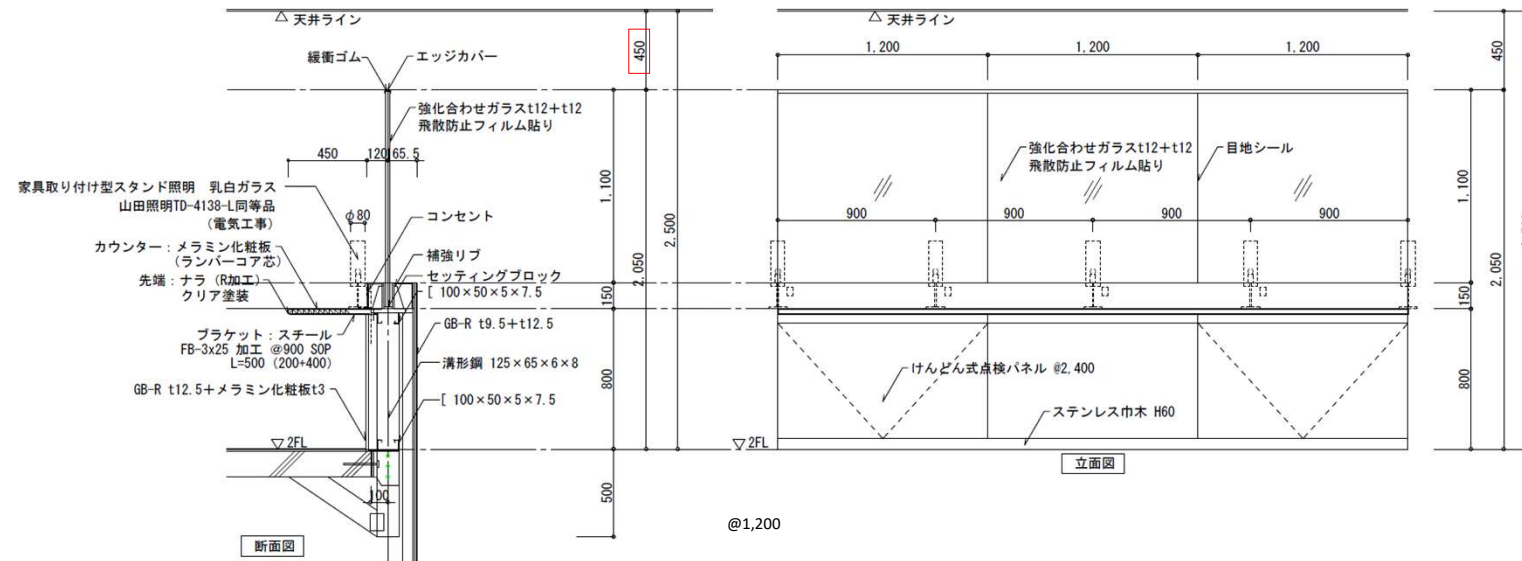


※詳細部については今後検討

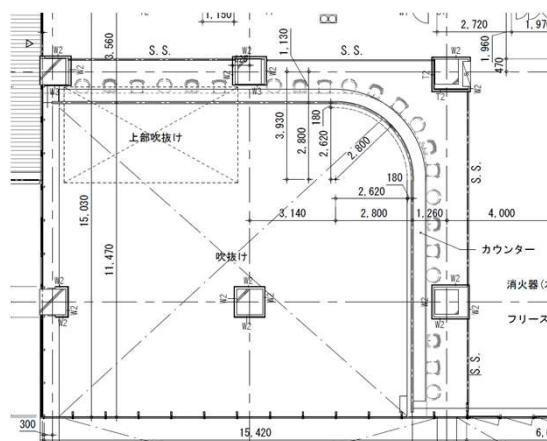

⑤ 4階屋上広場日除け設置

■間口9,000mm×出幅3,400mmの電動オーニング2基設置

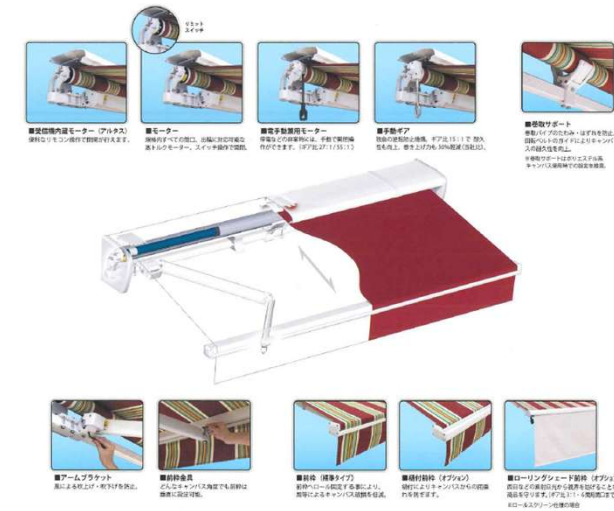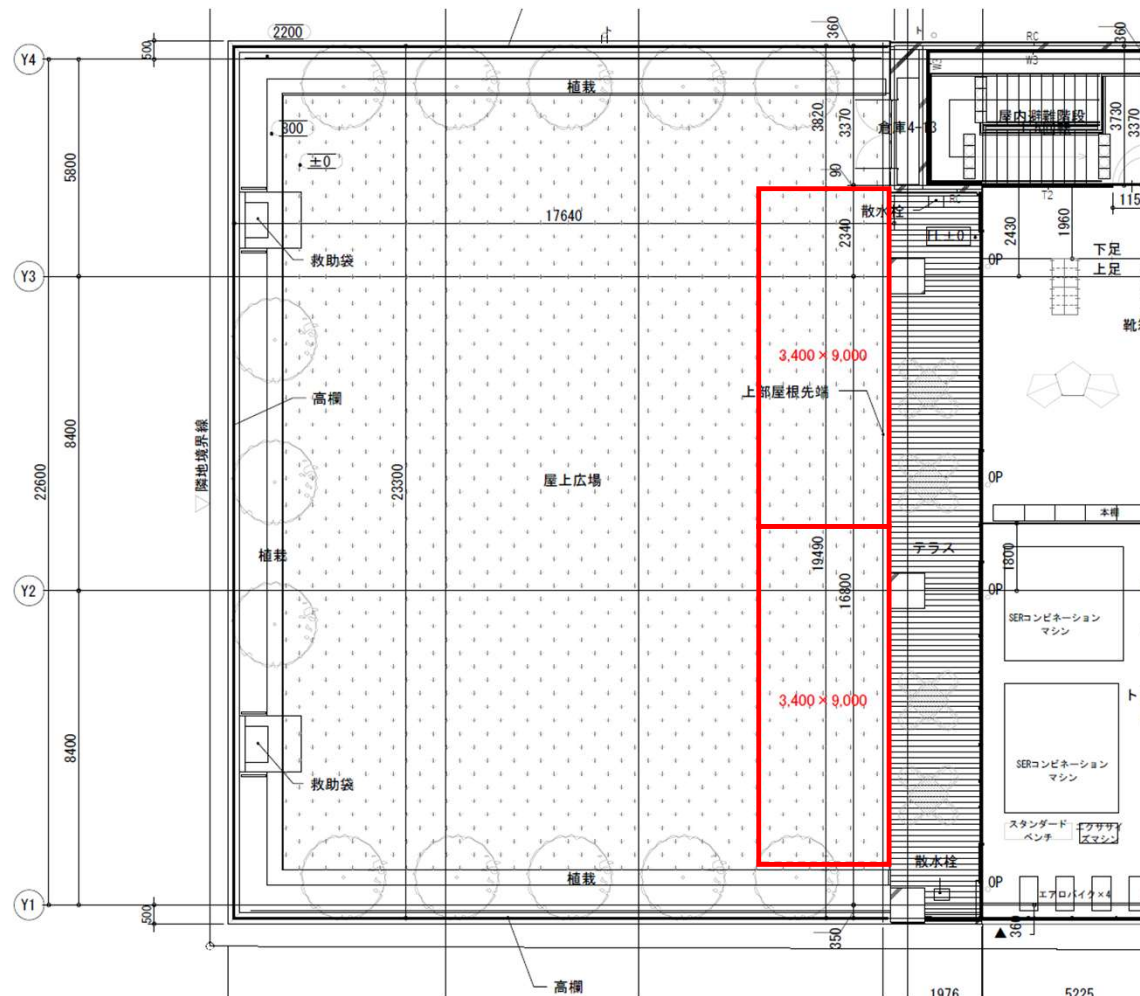

(引用元 太陽工業 HP)

⑥ 屋外広場植栽帯擁壁にロゴマークサイン設置

■擁壁を変更し、ロゴマークサイン設置（内照式）

- ・ A54サイン詳細図 O S1外壁施設名称サイン取りやめ

