明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事かわら版

第15号（令和８年11月号）
発行　アルソシア建設株式会社
TEL：078-965-7101


旧工場棟（西面）

① 上屋 解体状況
（10月上旬撮影）


旧工場棟（西面）

② 上屋 解体状況
（10月下旬撮影）

【平面図】


旧排水処理施設

③ 基礎 解体状況


東側

⑥ 旧工場棟・煙突 解体状況


敷地境界　北側

④ 旧工場棟上屋解体に伴う 環境調査状況

煙突

⑤ 外筒 解体状況

令和８年10月は、旧工場棟で上屋解体工事、旧排水処理施設で基礎解体工事を行いました。また、煙突では手作業による外筒解体工事を行い、煙突の高さが約60mから約35mになりました。
今月は、旧工場棟の上屋解体を継続し、新たに基礎解体工事を開始します。旧排水処理施設では基礎解体工事に加え杭抜き工事に着手し、煙突の外筒解体工事も継続します。騒音および粉じんの飛散防止に十分配慮しながら進めてまいります。

【今月の予定】

・旧工場棟	上屋解体、基礎解体工事
・旧排水処理施設	基礎解体工事、杭抜き工事
・煙突	外筒解体工事



工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

【環境調査結果状況】

令和８年10月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

項 目	環境調査結果
ダイオキシン類（大気） （基準値：0.6pg-TEQ/㎥）	測定地点：工事範囲境界４地点（図中 ●） 「対象の作業が完了したため、測定なし」（これまでの実績値：0.03～0.16pg-TEQ/㎥）
ダイオキシン類（土壌） （基準値：1000pg-TEQ/g）	測定地点：工事範囲境界４地点（図中 ●） 工事前後の状況確認のため基準値以下の土壌を設置し、現在経過観察中です。
粉じん（大気） （基準値：1.5mg/㎥）	測定地点：工事範囲境界４地点（図中 ●） 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。（10月：0.07～0.65mg/㎥）
石綿（大気） （基準値：10本/Ｌ）	測定地点：工事範囲境界４地点（図中 ●） 「対象の作業が完了したため、測定なし」（これまでの実績値：0.5本/L未満）
騒音 （基準値：85dB）	測定地点：工事範囲境界１地点（図中 ●） 工事中において、基準値を下回っていました。（10月：43～70dB）
振動 （基準値：75dB）	測定地点：工事範囲境界１地点（図中 ●） 工事中において、基準値を下回っていました。（10月：14～20dB）

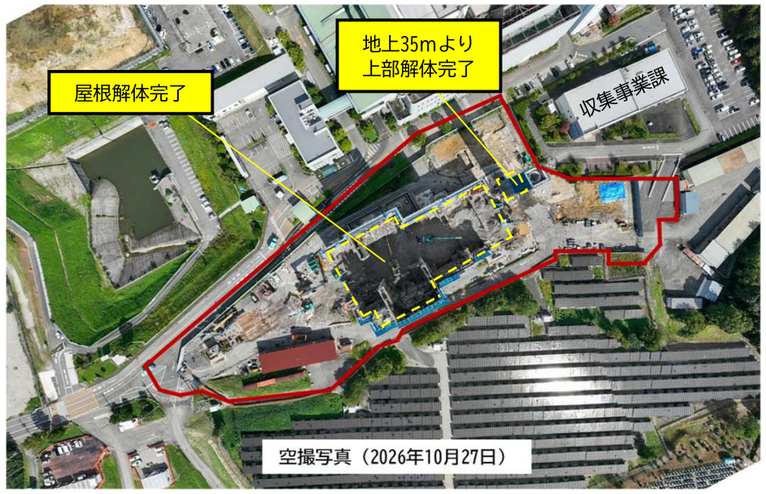

空撮写真（2026年10月27日）

工事に関する情報は、
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事

詳しくは
こちらから
